

◎平成28年度 10月臨時市議会補正予算概要

一般会計

(単位：千円)

事務事業名	金額	説明
保育所・認定こども園運営費	—	[(仮称) 草津中央認定こども園仮設園舎整備費 (草津保育所仮設園舎) (債務負担行為 H28～H29) 5,700] (別紙のとおり)
幼稚園運営費	—	[(仮称) 草津中央認定こども園仮設園舎整備費 (中央幼稚園仮設園舎) (債務負担行為 H28～H29) 37,300] (別紙のとおり)

中央幼稚園仮設園舎整備および草津保育所仮設園舎期間延長について

現在、実施している（仮称）草津中央認定こども園整備工事において、保育所棟の工事を進める中で、平成2年度竣工の草津保育所および中央幼稚園改築工事（建築工事）での施工不良が判明しました。

当時の工事施工者が、施工不良箇所の調査、試験等を実施しており、その結果を踏まえ、是正工事を早急に進め、一刻も早い施設の完成を目指しておりますが、是正等の対応にさらに期間を要することが判明し、施設の完成が当初予定していた期間よりさらにずれ込むため、認定こども園の開園を1年間延期することといたしました。

このため、是正等の対応にさらに期間を要することから、現在、工事中の草津保育所の隣りで過ごしている幼稚園児の保育環境の改善のために、仮設園舎を新たに整備することとします。また、保育所棟、幼稚園棟を一体的に改修することにより、可能な限り工期の短縮に努めることとします。併せて、現在の草津保育所仮設園舎の賃貸借についても、期間延長を行うものです。

1. 経過

平成28年	2月	2日	草津保育所仮設園舎賃貸借契約
	6月	3日	（仮称）草津中央認定こども園整備工事契約締結 ※契約工期は平成28年6月3日から平成29年3月15日まで
	8月	5日	建築課が現場にて施工不良箇所（コンクリートの打設不良等）を確認
	8月	18日	工事施工者に現状報告を行い、是正処理を求める。
	8月	26日	施工不良により是正工事が必要となる。（記者発表）
	10月	6日	是正等の対応にさらに期間を要するため、認定こども園開園を1年延期する。（記者発表）

2. 幼稚園仮設園舎建設場所およびイメージ図

草津小学校前庭（別添位置図のとおり）


3. 事業費（債務負担行為補正）

①幼稚園仮設園舎建設費（賃貸借契約）	37,300千円
②保育所仮設園舎賃貸借契約延長分	5,700千円

(仮称) 草津中央認定こども園整備工事にかかる仮設幼稚園舎建設計画

(敷地：草津小学校) 平成29年4月～完了まで

H28.10.18 建築制作

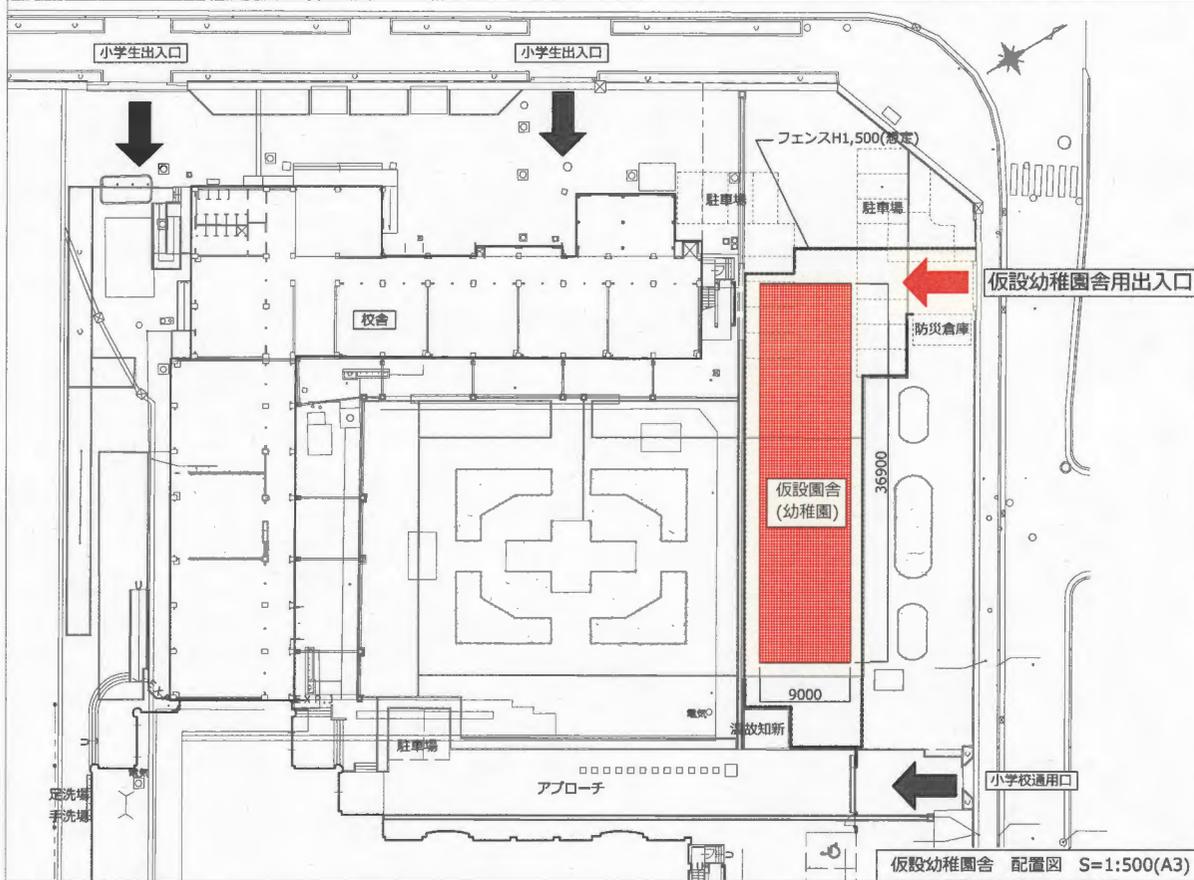

仮設幼稚園舎 配置図 S=1:500(A3)




仮設幼稚園舎用出入口



仮設幼稚園舎建設予定地



仮設幼稚園舎イメージ

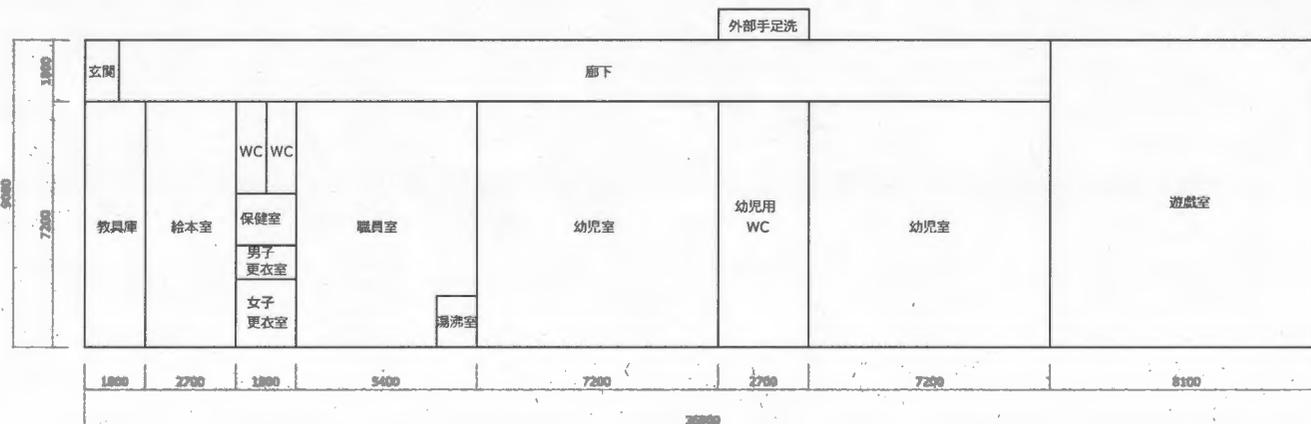

延べ面積： 332.10㎡

仮設幼稚園舎 平面プラン S=1:150(A3)
